

BOLETÍN DE OBRAS SETIEMBRE DE 2019

➔ OBRAS EN SOCA

En el Municipio de Soca, se estuvo realizando recargo en la entrada al barrio Escarpín para mejorar la accesibilidad a Ruta 35.



➔ OBRAS EN JAUREGUIBERRY

Se ejecutaron tareas de cruce de caños en calle Altamar para solucionar el drenaje pluvial de la zona.



➔ OBRAS EN SAN LUIS

En las calles 12 de octubre, Bolivia, Independencia y B. Brum se realizó la colocación de caños para alcantarillas, en el marco de las obras de acondicionamiento del drenaje pluvial que se está ejecutando en la zona. También se realizará apertura y limpieza de cunetas y entradas particulares.



CIUDAD DE LA COSTA CONTINÚA SU TRANSFORMACIÓN



Las obras de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad que se han desarrollado en los últimos años en Ciudad de la Costa han cambiado sustantivamente la calidad de la infraestructura de esta zona del departamento.

Durante setiembre, algunas de las tareas realizadas en el marco de este proyecto fueron:

Solymar Norte: comenzó el desmonte de la calle Paso Escobar. Esta etapa es previa a la obra vial que culminará con el tendido de asfalto en una extensión de 690 m entre ruta Interbalnearia y Márquez Castro.

En Solymar Sur: se asfaltó la auxiliar de Av. Giannattasio entre Artigas y Márquez Castro en un total de 425 m. Asimismo, comenzó la construcción de un dren en calle Rivera. Esta obra hidráulica es fundamental para el correcto escurrimiento de pluviales y permitirá posteriormente asfaltar esta calle.

En Lagomar Norte: se construyeron las cunetas y entradas en la Calle 42 y se realizó el mantenimiento con motoniveladora en toda la zona.



INICIO DE OBRAS

Obra de infraestructura vial e hidráulica en Suárez

Obra de infraestructura vial e hidráulica en 830 m sobre la calle Pérez Castellanos, que conecta Ruta 74 con camino a Las Piedritas.

Detalle de obra:

- Reciclado del actual pavimento.
- Repavimentación con carpeta asfáltica.
- Limpieza de cunetas.
- Alcantarillas de cruce.
- Resolución de interfase cordón-cuneta a cielo abierto.
- Señalización horizontal.



Obra de infraestructura hidráulica en Parque del Plata Norte – Etapa 1

Detalle de obra:

- Reconstrucción de las cunetas de la zona de obra.
- Cruces de calles.
- **Estructura de control de pluviales.**
- Descarga al arroyo Solís Chico.
- Acondicionamiento vial.

Construcción de una estructura de control en el espacio público ubicado entre las calles Av. República Argentina, Calle 3 y 4 y Calle 32, descargando posteriormente por los cancheros consecutivos mediante canalizaciones a cielo abierto, hasta la descarga actual. En el espacio a intervenir se realizará una reforestación.

Drenaje sustentable: el objetivo no es sólo evitar inundaciones en calles y viviendas, sino la mejora de la calidad de vida de los habitantes mediante un manejo sustentable del agua en la ciudad.



Obra de pavimentación en San Bautista

Obra de infraestructura vial que implica la pavimentación del tramo de la calle Treinta y Tres desde la vía férrea hasta la intersección con Luis A. de Herrera (plaza de San Bautista), y del tramo correspondiente al desvío del tránsito pesado de la calle Camino Nacional y la calle Tala hasta Pedro Maraboto.

Detalle de obra

- 6000 m² de retiro y demolición del pavimento existente.
- 6000 m² de reciclado del pavimento existente.
- 8815 m² de pavimentación de calle con mezcla asfáltica.



➔ AVANCE DE OBRA EN AV. BICENTENARIO EN LAS PIEDRAS




Avanzan las obras de rehabilitación de pavimento que se están ejecutando sobre Av. Bicentenario desde Rep. Argentina hasta la rotonda del Obelisco. En la avenida central y las calles laterales se ejecuta fresado, bacheo y recapado con mezcla asfáltica.

➔ OBRAS EN EL PARQUE METROPOLITANO EN LA PAZ



En el marco del proyecto del Parque Metropolitano de La Paz, la DGO está trabajando en la zona, realizando movimientos de suelo, calles nuevas, ciclovías, estacionamiento, veredas y el proyecto hidráulico de todo el parque.

➔ OBRAS EN 18 DE MAYO

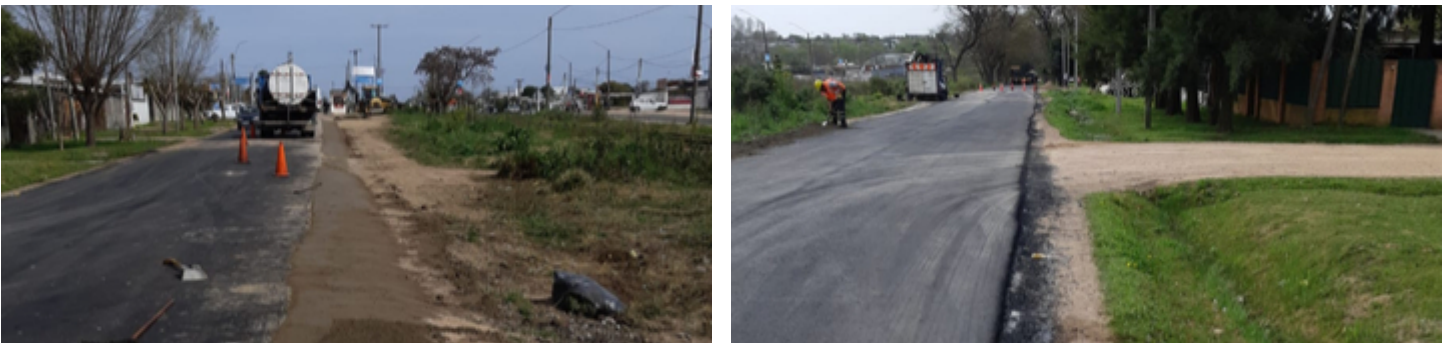

Se estuvo trabajando en continuación Elías Regules, donde se realizó un recapado y calce de banquina en algunos sectores.

➔ OBRAS EN TALA

Avanza obra en ex Ruta 40

Avanza la obra de pavimentación en ex Ruta 40; se estuvo realizando estabilizado con cemento e imprimación.

La obra abarca 10 km de tratamiento bituminoso doble con sellado, reconstrucción y acondicionamiento de cunetas, alcantarillas y señalización vial.



Obra de rehabilitación de pavimento

En Tala se está realizando una obra por Administración que consiste en tratamiento bituminoso, carpeta asfáltica y reposición de base, en las calles: I. de León, Villega y Azuaga, 18 de Julio entre José A. y Trelles (Ruta 7) y Florida.



➔ OBRAS EN MIGUES

Repavimentación de Av. Eugenio Migues, tramo común con Ruta 80 y Ruta 81 en zona urbana de la ciudad de Migues. Obra convenio entre MTOP – IC.



➔ OBRAS EN EL SANTORAL

San Ramón:

- Avanza la obra de reparación y repavimentación en la Av. José Batlle y Ordóñez en toda su extensión.
- También se están ejecutando obras por Administración en barrio Cipriano, limpieza de cunetas y recargo.
- Continuando con el Plan de Caminería Rural, se realizaron tareas de mantenimiento recurrente en San Ramón: Segade, camino Moreira y Camino 864.

San Antonio:

Se está haciendo obra por Administración en zona cercana a Mevir en unos 700 m, limpieza de cunetas y entradas particulares.

Santa Rosa:

En la zona de Mevir I y Mevir II y III se realizó limpieza de cunetas, recargo, entradas particulares y alcantarillas.

San Bautista:

- Barrio La Vascongada, limpieza de cunetas, sustitución de caños y alcantarillas.



→ COLOCACIÓN DE DOVELAS EN TOLEDO

La Intendencia de Canelones está ejecutando obras de colocación de dovelas en cruces de caminos. En este sentido, se trabajó en el camino de Las Tropas en el Municipio de Toledo, donde la obra funcionará como puente para dar apertura y pasaje desde el camino hacia la Ruta 33, permitiendo la conectividad con el polo educativo, viviendas y áreas recreativas que están en la zona.



→ OBRA EN BYPASS DE SAUCE

La obra de infraestructura vial se está ejecutando en el Bypass de Sauce, en las calles Santa Isabel y Lavalleja, en una extensión total de unos 1200 m. Desde que inició la obra en el mes de abril y se comenzó con su replanteo, se han realizado los siguientes trabajos hidráulicos:

- 1200 m de limpieza y/o conformación de cunetas.
- 200 m de alcantarillas de caños de hormigón armado (cruces de calle y colectores pluviales).
- 160 m de alcantarillas de caños de hormigón simple (entradas particulares, vehiculares y peatonales).
- 20 m³ de cabezales.
- 4 cámaras de inspección para colectores pluviales.
- La última semana de setiembre se comenzó con la realización de badenes de hormigón.

La obra ha presentado una dilación que afectó el cronograma inicial, debido a dificultades surgidas durante la realización de las tareas (interferencias con redes de servicios públicos, construcciones que no respetan la alineación de propiedad y vertido de aguas servidas por parte de los vecinos, entre otras). Esto provocó replantear algunos aspectos del proyecto y modificar plazos de ejecución.

Actualmente se están ajustando las tareas para disminuir la afectación en la población residente respecto a las distorsiones y molestias inevitables que se presentan durante la obra (ruidos, polvo y falta de acceso vehicular a domicilios en el desarrollo de algunas tareas).

Está previsto que en la última semana de octubre inicien las tareas vinculadas a la pavimentación.



➔ AVANZA PLAN DE OBRAS EN SALINAS NORTE

Las obras en la calle San Salvador continúan a buen ritmo. Durante las últimas semanas se ejecutó la obra hidráulica que implicó, entre otras tareas, la construcción de un canal para conducción de pluviales. Este canal nace en la calle Minuanes y se extiende hasta Achiras, desembocando en un colector de 1000 mm.

En la siguiente etapa de obra se realizará la pavimentación de las calles San Salvador, Minuanes y Zapicán.



➔ OBRAS EN BARROS BLANCOS



Se está trabajando en una obra hidráulica en calle India Muerta en la colocación de una alcantarilla de cinco bocas de caños de 1000, en la zona de villa El Tejado.

➔ OBRAS EN CANELONES

Se está realizando la limpieza de una cañada en Ruta 5 km 40, en la zona de Villa Guadalupe. Se han limpiado 800 m y las tareas continúan hacia la vía férrea.

Además en Caminería Rural se trabaja en camino Lloveras, realizando tareas de mantenimiento ordinario.



➔ CANELONES SE ILUMINA

Avanza el Plan de Alumbrado Público, en el mes de setiembre se realizaron las siguientes inauguraciones:

Municipio La Floresta

Santa Lucía del Este - 19 luminarias LED de 41w y cuatro reflectores LED 200w Philips.

Araminda - 15 luminarias LED de 75w y cuatro reflectores LED de 200w Philips.

Bello Horizonte Avda. 1 e/ Calle 41 e Interbalnearia - 24 luminarias LED 80w.

Cancha BBFF – Bello Horizonte, iluminación con seis reflectores HPIT 400w.

Total: 72 luminarias tecnología LED.

Municipio Progreso

- 77 luminarias LED en Progreso, Barrio Los Manzanos.

Municipio de Barros Blancos

- Barrio La Ruta - 52 luminarias LED 42w.

- Calle Tacuarembó - 42 luminarias LED de 42w.

Total: 94 luminarias.

Municipio de Salinas

- Marindia Norte - 37 luminarias LED 41w.

- Marindia Sur - 92 luminarias LED 41w.

- Neptunia - 20 luminarias LED 41w.

Total: 149 luminarias de tecnología LED 41w.
