

RESUMEN DE OBRAS BOLETÍN ENERO DE 2019

➔ AVANCE DE OBRAS EN EL SANTORAL

Santa Rosa

Obra de infraestructura vial e hidráulica: Se está trabajando en la calle 18 de Julio entre Tomás Berreta y Luis A. de Herrera en la preparación del firme para la posterior imprimación.

Además, avanza la consolidación de barrio por Administración que abarca las calles Testuri, R. López, Roca y Florencio Sánchez, donde se está realizando preparación del firme, imprimación y entradas particulares.

San Antonio

Obra de consolidación de barrio: Se está realizando colocación de cabezales y limpieza de cunetas.

San Ramón


Perfilado y mantenimiento ordinario en distintas calles de la planta urbana.

San Bautista

Obra de pavimentación: primera etapa, 400 m de tratamiento bituminoso en las calles Margarita Martínez de Fariña y Marabotto. Se realizó preparación del firme e imprimación.

Plan de Caminería Rural 2019 en El Santoral

Tareas de mantenimiento en enero: Camino a la estancia (San Bautista); Camino Silva (Santa Rosa); Camino San Antonio – Santa Rosa; Bypass Santa Rosa.

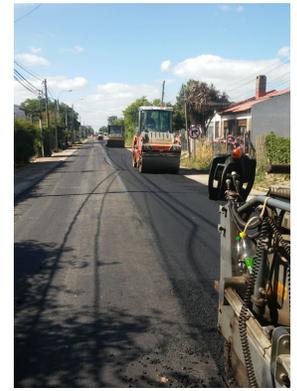

OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA EN LA PAZ Y LAS PIEDRAS

La Intendencia de Canelones está ejecutando la segunda etapa de la obra de infraestructura vial e hidráulica en las calles César Mayo Gutiérrez y Luis Batlle Berres (ex Municipio) en una extensión de 3,2 km desde Ruta 48 hasta Aldabalde. La obra abarca los municipios de La Paz y Las Piedras.

En una primera etapa se pavimentó el tramo comprendido entre Ruta 48 y Carmelo Colman, restando realizar la señalización correspondiente.

Retomando la obra se ha realizado:


- * Fresado de la carpeta asfáltica existente y cunetas en las calles Artes y 17 Metros.
- * Dos reductores de velocidad en la esquina de José Ellauri.
- * Como obra anexa de desagüe, se trabajó en la limpieza y conformación de cunetas en la calle Colman colocándose, losetas de hormigón para las entradas peatonales y unos 23 m de tuberías de 600 mm de diámetro para las entradas vehiculares allí existentes.
- * En la zona de los cementerios (Municipio casi Aldabalde) se comenzaron las obras necesarias para el correcto escurrimiento de las aguas superficiales que allí llegan, hasta el momento se encuentran en proceso tres bocas de tormenta tipo 3 que irán conectadas a un colector de 800 mm de diámetro a construirse bajo la calzada.

➔ AVANCE DE OBRAS

OBRA VIAL E HIDRÁULICA EN DR. ENRIQUE POUHEY-AV. JOSÉ ARTIGAS

La obra en su totalidad se extiende en 8,6 km entre los municipios de Progreso, Las Piedras y 18 de Mayo.

Actualmente se está trabajando en la zona de Progreso en un tramo de 4,6 km. Las tareas consisten en fresado de la carpeta asfáltica vieja para regularizar todo al mismo nivel y sobre ella se coloca un tratamiento antirreflejo. Además, se construyen alcantarillas, pluviales y se realiza limpieza de cunetas.

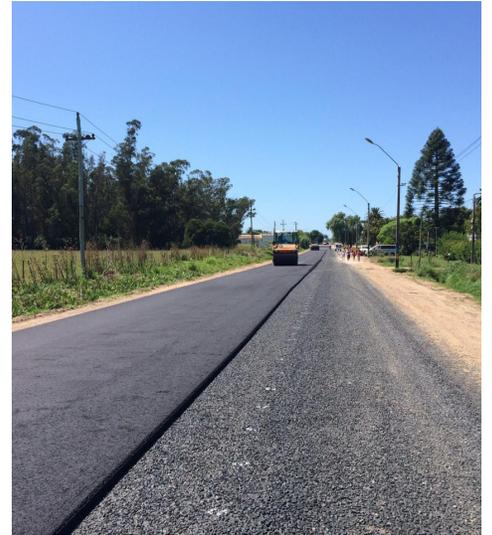

COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO

La Dirección General de Obras avanza en la obra hidráulica en Avda. Maestro Julio Castro y las calles Padre José Novoa y Grito de Asencio. La obra abarca la construcción de un colector pluvial de 770 m que canalizará correctamente el escurrimiento del agua sobre Avda. Maestro Julio Castro.

Se ha colocado el 95% del entubado de caños de 1200 mm en calle Grito de Asencio. Luego se iniciará el entubado de 800 mm por la calle Padre Novoa hacia Castro. Además, finalizó la ejecución de dos cámaras de inspección de hormigón armado y se está trabajando en el armado de las seis restantes por la calle Grito de Asencio.





AVANCE DE OBRAS

OBRA DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN MIGUES



Se estuvo trabajando en calle Uruguay desde Ruta 80 hasta Diego Lamas, en Luis A. de Herrera desde Ruta 80 hasta Francisco Viera, en la circunvalación de la plaza y en Varela hacia Ruta 80.

Se están realizando tareas de sustitución de base e imprimación, y posteriormente se pavimentará.

La obra en total abarca: 700 m de tratamiento bituminoso doble con sellado, 1.200 m de carpeta asfáltica, 274 m de alcantarillas, 1.700 m de construcción y acondicionamiento de cunetas y señalización vial.

OBRA DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN PANDO

Hasta el momento se han ejecutado las siguientes tareas:

Sustitución de entradas peatonales y vehiculares con sus correspondientes cabezales en calles:

- Melvin Jones entre Auxiliar Ruta 8 y Héctor Crespi (falta senda oeste)
- Héctor Crespi entre Melvin Jones y Analía de los Santos
- Analía de los Santos entre Auxiliar Ruta 8 y Pura Protta
- Pura Protta entre Melvin Jones y Analía de los Santos (solo senda sur)

Limpieza y Conformación de cunetas en calles:

- Melvin Jones entre Auxiliar Ruta 8 y Héctor Crespi
- Héctor Crespi entre Melvin Jones y Analía de los Santos
- Analía de los Santos entre Auxiliar Ruta 8 y Pura Protta
- Pura Protta entre Analía de los Santos y calle al final

Cruces de alcantarillas:

- Esquina Auxiliar y Melvin Jones
- Esquina Auxiliar Y Analía de los Santos
- Esquina Analía de los Santos y Pura Protta
- Esquina Pura Protta y calle final



➔ CANELONES Y LOS CERRILLOS

En el Municipio de Los Cerrillos se está haciendo la limpieza del arroyo Brujas Chico, en una extensión de 400 m.

En el Municipio de Canelones, en calle Monegal entre Álamo de Suárez y Michelini, se está realizando la preparación de base e imprimación para la colocación de 300 m de tratamiento bituminoso simple.



➔ CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MÁRQUEZ CASTRO EN SOLYMAR



La Dirección General de Obras está trabajando en la resolución de un problema hidráulico en la calle James Summer en Solymar. Las obras previstas incluyen la construcción de un colector pluvial en Márquez Castro entre Summer y Acacias. El colector pluvial se conectará al macrocanal recientemente construido y permitirá la efectiva conducción de pluviales hacia la faja costera.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la construcción de un canal prefabricado de hormigón en la calle Achiras.

➔ CANELONES SE ILUMINA

En el 2019 Alumbrado Público continúa iluminado distintos puntos del departamento, siguiendo el plan de obras establecido. En el mes de enero se encendieron nuevas luminarias en seis municipios:

Municipio de Aguas Corrientes: Cancha de baby fútbol. 8 reflectores Hpi-t 400w.

Municipio de Ciudad de la Costa: 144 luminarias LED 50w en Solymar.

Municipio de Soca: cancha de baby fútbol del Club Racing. Se instalaron 8 reflectores Hpi-t 400w.

Municipio Parque del Plata: 108 luminarias de 150w (Sodio).

Municipio La Floresta, Balneario Jaureguiberry: Calle Acapulco, 41 luminarias de 50w tecnología LED.

Municipio de San Bautista: Mevir Castellano, 61 luminarias.

