


CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN PANDO

Avance de obra a noviembre de 2019

- ➔ Avanzan las obras de consolidación de barrios de Pando en Los Plátanos, Matorral y Citrama, además se está trabajando en el acondicionamiento del sistema de drenaje de la calle Luis A. de Herrera. El proyecto incluye también los barrios Centenario, El Parque y Camino Ancap.

Se informa que en virtud de la licencia reglamentaria de la construcción del 23 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020, las obras del proyecto se verán momentáneamente interrumpidas, por lo que se solicita a la población circular con precaución por las zonas de obra.

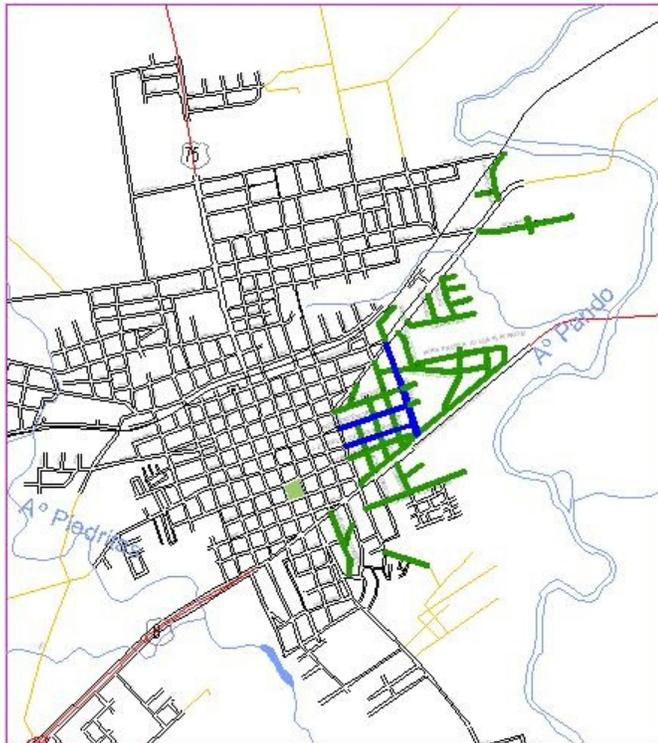

← Plano general de la Consolidación de barrios de Pando



BARRIO LOS PLATANOS							
CALLE	LimPieza de Cunetas	Entradas Domiciliarias			Alcantarillas		Cape Sale
		ML	Entradas Peatonales	Entradas Vehiculares	ML	Unidades	
Pura Protta (mas calle corta #)	860	42	56	299	2	14	572
Hector Crespi (mas calle corta #)	660	37	52	261	2	16	531
República de Chile	200	9	19	91	2	18	210
Melvin Jones	450	16	25	130	1	8	-----
Analia de los Santos	240	5	14	70	1	8	134
Auxiliar Ruta 8	1100	4	14	74	10	84	410
TOTALES	3510	113	180	925	18	148	1857

NOTAS:	<p>* Se abrieron unos 70 ml de calle paralelos a Analia de los Santos del lado este, uniendo la Auxiliar de R8 y Pura Protta.</p> <p>* Las entradas domiciliarias están contabilizadas como peatonales (las cuales solo tienen un caño y su largo útil ronda 1,60 mts) y vehiculares las cuales pueden tener dos o más caños, dependiendo de las necesidades y posibilidades en cada padrón. En cualquiera de los casos las entradas se conforman con cabezales de hormigón armado.</p> <p>* En las calles Pura Protta y Héctor Crespi, entre República de Chile y Melvin Jones se encuentran dos calles cortas sin salida a las cuales se les realizó el mismo tratamiento (Cape Seal) y sus metrajes están incluidos en las calles adyacentes.</p> <p>* Queda pendiente la realización del tratamiento (Cape Seal) en la calle auxiliar de Ruta 8 desde Jacinto Pargas hasta la rotonda del By Pass y Melvin Jones en su totalidad.</p>
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BARRIO MATORRAL							
CALLE	LimPieza de Cunetas	Entradas Domiciliarias			Alcantarillas		Cape Sale
		ML	Entradas Peatonales	Entradas Vehiculares	ML	Unidades	
Charrúa	460	10	17	83	2	18	405
Azteca	235	13	15	80	-----	-----	110
Sin Nombre	80	0	3	14	1	6	65
Maya	-----	-----	-----	-----	1	6	-----
Guenoa	225	7	16	75	1	8	150
Inca	390	11	21	96	1	8	-----
TOTALES	1390	41	72	349	6	46	730

NOTAS:	<p>* Durante esta obra se realizaron trabajos sobre Avda. Luis Alberto de Herrera de limpieza de cunetas y colocación de entradas particulares las cuales están metradas en el informe correspondiente a Luis Alberto de Herrera.</p> <p>* Queda pendiente la realización del tratamiento (Cape Seal) en calle Inca.</p>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Luis Alberto de Herrera							
CALLE	LimPieza de Cunetas	Entradas Domiciliarias			Alcantarillas		Losetas
		ML	Entradas Peatonales	Entradas Vehiculares	ML	Unidades	
Luis Alberto de Herrera	1160	0	25	112	5	56	,-----
Dr. Peluffo	290	2	4	21	,-----	,-----	8
La Manchega	,-----	,-----	,-----	,-----	1	10	,-----
TOTALES	1450	2	29	133	6	66	8

NOTAS:	* Las obras realizadas sobre Avda. Luis Alberto de Herrera son de carácter imprescindible, ya que la evacuación pluvial de gran parte de los barrios desagota sobre esta y la cual ya presentaba problemas importantes previos a la intervención de los diferentes barrios.
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BARRIO CITRAMA						
CALLE	LimPieza de Cunetas	Entradas Domiciliarias			Alcantarillas	
		ML	Entradas Peatonales	Entradas Vehiculares	ML	Unidades
Citrama	265	3	14	55	1	12
TOTALES	265	3	14	55	1	12

NOTAS:	* El metraje correspondiente a limpieza de cunetas y entradas particulares corresponden al mes en curso.
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Imágenes en obra de consolidación barrial en Pando



Imágenes en obra de consolidación barrial en Pando
